

2000年度  
行政監査

# 서울特別市鐘路區議會 財務建設委員會會議錄

서울特別市鐘路區議會事務局

被監査部署 建設交通局

日 時 2000年6月29日(木) 10時 01分

場 所 財務建設委員會室

## 2000年度 主要業務推進現況



### 建設交通局

## 보고순서

□ 일반현황

□ 2000년도 주요업무추진현황 및 추진계획

○ 건설관리과

○ 토 목 과

○ 교통행정과

○ 교통지도과

# 일 반 현 황

## 1. 직원 및 행정장비 현황

□ 직 원

2000. 5. 31현재

| 구     | 분   | 계   | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기능직 | 전문 | 방법원 | 비 고                      |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|--------------------------|
| 계     | 정 원 | 163 | 1  | 4  | 15 | 22 | 26 | 14 | 79  |    |     |                          |
|       | 현 원 | 249 | 1  | 4  | 19 | 24 | 27 | 8  | 80  |    |     | 상용 26<br>일용 19<br>공익 119 |
|       | 과부족 | +84 |    |    | +4 | +2 | +1 | -6 | +1  |    |     |                          |
| 건설관리과 | 정 원 | 38  | 1  | 1  | 4  | 6  | 5  | 3  | 18  |    |     |                          |
|       | 현 원 | 42  | 1  | 1  | 5  | 7  | 6  |    | 19  |    | 3   | 상용 1<br>일용 19<br>공익 12   |
|       | 과부족 | +4  |    |    | +1 | +1 | +1 | -3 | +1  |    | +3  |                          |
| 토 목 과 | 정 원 | 48  |    | 1  | 5  | 8  | 12 | 3  | 19  |    |     |                          |
|       | 현 원 | 50  |    | 1  | 5  | 9  | 10 | 7  | 17  |    |     | 상용 25<br>공익 1            |
|       | 과부족 | +1  |    |    |    | +1 | -2 | +4 | -2  |    |     |                          |
| 교통행정과 | 정 원 | 21  |    | 1  | 3  | 4  | 5  | 3  | 3   | 2  |     |                          |
|       | 현 원 | 22  |    | 1  | 4  | 3  | 8  |    | 5   | 1  |     | 공익 4                     |
|       | 과부족 | +1  |    |    | +1 | -1 | +3 | -3 | +2  | -1 |     |                          |
| 교통지도과 | 정 원 | 56  |    | 1  | 3  | 4  | 4  | 5  | 39  |    |     |                          |
|       | 현 원 | 134 |    | 1  | 5  | 5  | 3  | 1  | 39  |    | 80  | 공익 102                   |
|       | 과부족 | +78 |    |    | +2 | +1 | -1 | -4 |     |    | +80 |                          |

□ 행정장비

| 구     | 분 | 전 자<br>복사기 | 컴퓨터 | 팩시밀리 | 카메라                         | 기 타                                 |
|-------|---|------------|-----|------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 건설관리과 | 대 | 1          | 29  | 1    | 4                           | ○ 비디오 카메라 2대<br>○ 고압세정기 1대          |
| 토 목 과 | 대 | 2          | 36  | 1    |                             | ○ 제설기 10대<br>○ 콘베아벨트 2대<br>○ 준설기 8대 |
| 교통행정과 | 대 | 3          | 25  | 1    | 1                           |                                     |
| 교통지도과 | 대 | 3          | 64  | 3    | 디지털 40<br>비디오 20<br>일반카메라10 | ○ 견인차량 1대<br>○ 단속차량 3대              |

## 2. 과별 소관업무 현황

| 과 명   | 담당명   | 관 장 업 무   |
|-------|-------|---|
| 건설관리과 | 관 리   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공용지(도로, 하천·구거)의 점·사용허가</li> <li>○ 전문건설업·건설기계에 관한 사무</li> <li>○ 과내 다른계에 속하지 아니하는 사항</li> </ul>   |
|       | 과 징   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공용지 점·사용료 부과 징수</li> <li>○ 광고물 점용료 부과 징수</li> <li>○ 무단·불법점용자 변상금 및 과태료 징수</li> </ul>            |
|       | 보 상   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공용지의 취득보상</li> </ul>  |
|       | 가로정비  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환경순찰 확인 및 가로적치물 제거</li> <li>○ 도로일시점용 허가</li> </ul>   |
| 토 목 과 | 토 목   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로 및 토목공사 계획 수립 및 집행</li> <li>○ 도로 및 토목공사의 설계, 시공 및 감독</li> <li>○ 과내 다른계에 속하지 아니하는 사항</li> </ul> |
|       | 도로관리  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로 및 보도 시설물 유지관리</li> <li>○ 제설작업의 계획 및 실시</li> <li>○ 지하도, 지하광장, 터미널 및 그 부속물의 유지관리</li> </ul>     |
|       | 조 명   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로등, 보안등 시설의 공사계획 수립 및 시행</li> <li>○ 지하보·차도, 공동구의 기전시설 유지관리</li> </ul>                           |
|       | 하 수   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수행정 종합조정지도</li> <li>○ 하천시설 계획 및 집행, 유지관리</li> </ul>   |
|       | 지 하수  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 사용료 부과징수</li> <li>○ 지하수 개발, 이용, 변경, 중지 허가(신고) 접수처리</li> <li>○ 배수펌프장 운영관리</li> </ul>          |
| 교통행정과 | 교통행정  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통종합대책</li> <li>○ 교통유발부담금 부과 징수</li> <li>○ 운수업체 부대시설 인가</li> </ul>                               |
|       | 교통시설  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통소통 개선사업</li> <li>○ 교통표지판 설치 관리</li> <li>○ 공영, 노상주차장 설치</li> </ul>                              |
|       | 자동차등록 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차 신규등록</li> <li>○ 자동차 이전등록</li> <li>○ 자동차 구조변경</li> </ul>                                      |
| 교통지도과 | 주차관리  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법주·정차단속 관련 업무</li> <li>○ 주차장(노외,부설) 관리업무</li> <li>○ 무단방치차량 처리</li> </ul>                        |
|       | 운수지도  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 버스전용차로 운영 및 과태료 부과</li> <li>○ 법규위반차량 지도단속</li> <li>○ 자동차 정비, 매매업소 업무</li> </ul>                  |
|       | 주차과징  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차위반 과태료 조정 및 징수결의</li> <li>○ 주차위반 과태료 체납관리 및 징수업무</li> <li>○ 민원접수 및 과태료 고지서 발급</li> </ul>       |

### 3. 주요현황(2000. 5. 31현재)

도로현황

| 연 장       | 도 로 율  | 포 장 율  | 면 적                     |
|-----------|--------|--------|-------------------------|
| 265,620km | 21.43% | 99.06% | 2,584,298m <sup>2</sup> |

하수도 보급현황

| 합 계   | 전 체 면 적(km <sup>2</sup> ) |             |            |            |            | 하수도 보급면적(km <sup>2</sup> ) |              |            |
|-------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|
|       | 기 개발지                     |             | 개 발<br>확정지 | 개 발<br>가능지 | 개 발<br>불능지 | 하수관거<br>필요면적               | 하수관거<br>시설면적 | 보급율<br>(%) |
|       | 관 거<br>보급지                | 관 거<br>미보급지 |            |            |            |                            |              |            |
| 24.01 | 11.813                    | -           | -          | 0.04       | 12.157     | 11.813                     | 11.813       | 100        |

운송업체 현황

| 총 계 | 시내버스 | 마을버스 | 화물자동차 | 전세버스 | 개인택시 | 비 고 |
|-----|------|------|-------|------|------|-----|
| 342 | 0    | 9    | 6     | 14   | 313  |     |

□ 자동차등록 현황

| 구 분 | 계      | 승용차    | 버스(승합) | 화 물   | 특 수 | 비 고 |
|-----|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
| 합 계 | 49,159 | 36,336 | 6,700  | 6,042 | 81  |     |
| 관 용 | 3,009  | 1,758  | 832    | 398   | 21  |     |
| 자가용 | 44,517 | 33,933 | 5,237  | 5,321 | 26  |     |
| 영업용 | 1,633  | 645    | 631    | 323   | 34  |     |

□ 주차시설 현황

| 구 분                 | 총 계       | 공 영 주 차 장 |       |          |        | 민 영 주 차 장 |         |         |
|---------------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|-----------|---------|---------|
|                     |           | 소 계       | 노 상   | 노 외      | 거주자    | 소 계       | 부 설     | 노 외     |
| 개 소                 | 3,730     | 81        | 17    | 9        | 55     | 3,649     | 3,450   | 199     |
| 구 획 수               | 45,277    | 2,301     | 464   | 179      | 1,658  | 42,976    | 37,016  | 5,960   |
| 면적(m <sup>2</sup> ) | 1,018,237 | 29,215.57 | 6,321 | 2,998.57 | 19,896 | 989,022   | 795,417 | 193,605 |

# 2000年度 主要業務推進現況

建設管理課

## 2000년도 주요업무 추진현황

### □ 국·공유(도로,구거,하천)재산관리

○ 국·공유지(도로,구거,하천)현황 — 2000. 5. 31현재  
(단위 : 천m<sup>2</sup>)

| 구 분 | 전 체   |       | 국유재산  |     | 시유재산  |     | 공유재산  |       | 비 고 |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|
|     | 필지    | 면 적   | 필지    | 면 적 | 필지    | 면 적 | 필지    | 면 적   |     |
| 계   | 9,506 | 2,485 | 3,585 | 688 | 2,034 | 760 | 3,887 | 1,037 |     |
| 도 로 | 8,687 | 2,032 | 3,509 | 642 | 1,985 | 699 | 3,193 | 691   |     |
| 구 거 | 638   | 177   | 58    | 14  | 31    | 4   | 549   | 159   |     |
| 하 천 | 181   | 276   | 18    | 32  | 18    | 57  | 145   | 187   |     |

- 조사대상 : 총 9,506필지, 면적 2,485천m<sup>2</sup>
- 추진내용
  - 동사무소별 현장실태조사 실시 : 2000. 3. 6 ~ 4. 30
  - 지적도 등 관련공부 및 현장확인 : 2000. 5. 1 ~ 6. 30

### □ 사설안내표지 일제정비

○ 사설안내표지 현황 — 2000. 5. 31현재  
(단위 : 개소)

| 설 치 수 량 |     |     | 정 비 대 상 |     |             |                |              |     |
|---------|-----|-----|---------|-----|-------------|----------------|--------------|-----|
| 전 체     | 허 가 | 무허가 | 계       | 관공서 | 변상금과<br>부 과 | 무단설치분중<br>철거예정 | 학교 및<br>규정적합 | 비 고 |
| 368     | 112 | 256 | 256     | 131 | 20          | 88             | 39           |     |

- 정비대상 : 관내 무단설치분중 철거예정 88개소
- 추진내용
  - 사설안내표지 일제조사 실시 : 2000. 3월 ~ 5월
  - 자진철거 및 허가신청 안내문 발송 : 2000. 6. 5
  - 자진철거 현장확인 및 허가신청 처리 : 2000. 6월 ~ 7월

□ 공공용지 점용료 징수(2000. 5. 31현재) - 구수입

(단위 : 천원)

| 구 분                        | 목표액(A)    | 조정액(B)    | 징수액(C)    | 진도율(A/C) |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 계                          | 4,150,779 | 2,409,735 | 1,939,852 | 46.7     |
| 도 로                        | 2,526,349 | 2,062,960 | 1,646,976 | 65.2     |
| 하천·구거                      | 379,080   | 219,271   | 186,414   | 49.2     |
| 기 타 수 입<br>(과태료,교부금,과년도수입) | 1,245,350 | 127,504   | 106,462   | 8.5      |

○ 분야별 추진실적

- 재산압류 : 250건 122,518천원
- 공매진행 : 1건 27,619천원

□ 돌출간판 도로점용료(변상금) 산정기준 변경시행

- 점용료가 선납제 시행으로 징수율 제고
- 기존 양면부과에서 1면 부과로 민원편의 제공
- 정기분(허가분)부과와 변상금(무허가분)부과로 구분
  - 정기분 : 3월 부과(2,343건 293,590천원)
  - 변상금 : 12월 정기분의 120% 부과

□ 공공용지의 취득 및 손실보상(2000. 5.31현재)

○ 현 황

- 총 8개사업 15,050백만원
  - ┌ 시 비 : 4개사업 13,800백만원
  - └ 구 비 : 4개사업 1,250백만원

- 보상내역

| 사업명 | 보상대상       |            |              | 보상실적       |            |              | 추진상황         |
|-----|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|     | 토지<br>(필지) | 지장물<br>(건) | 예산액<br>(백만원) | 토지<br>(필지) | 지장물<br>(건) | 예산액<br>(백만원) |              |
| 계   | 246        | 110        | 15,050       | 0          | 0          |              |              |
| 시사업 | 217        | 98         | 13,800       | 0          | 0          |              | - 보상중 : 4개사업 |
| 구사업 | 29         | 12         | 1,250        | 0          | 0          |              | - 보상중 : 4개사업 |

□ 노점상·노상적치물 정비

○ 정비실적(2000. 5. 31현재)

- 노점상 및 노상적치물 단속·제도실적

| 노점상     | 노상적치물   | 변상금 |        | 과태료 |        |
|---------|---------|-----|--------|-----|--------|
|         |         | 건   | 금액(천원) | 건   | 금액(천원) |
| 10,640건 | 10,201건 | 265 | 2,947  | 197 | 9,510  |

- 도로무단점용행위 특별단속

- 심야특별단속 : 11회 561명
- 유관부서 합동단속 : 4회 591명

○ 대시민 홍보실적

| 홍보물 배부    | 자율정비 거리방송 | 기 타 |
|-----------|-----------|-----|
| 2종 4,000매 | 6,976회    |     |

## 2000년도 주요업무 추진계획

### □ 국·공유재산관리 내실화

- 내 용 : 국·공유재산(도로,구거,하천)의 유지·보존등 재산관리 업무를 체계적이고 효율적으로 관리
- 대 상 : 9,506필지 2,485천 $m^2$
- 추진계획
  - 공공용지 관리실태 전수조사 및 미정리된 공부정리
  - 무단점용 추정지역 정밀조사 및 현황측량
  - 공공용으로 기능이 상실된 재산은 용도폐지
  - 공공용지 점유자 발굴 및 점용료 부과징수하여 세외수입 증대

### □ 공공용지 점용료 부과·징수체계 확립

- 내 용 : 탈루세원 방지 및 신규세원을 확보하고 세외수입 징수체계 확립
- 세입목표 : 45,775 $m^2$  4,150백만원
- 추진계획
  - 허가분 정기부과와 무허가분 변상금 부과로 구분 징수
  - 정밀조사로 신규세원 발굴
  - 체납자에 대한 채권확보 및 납부독려로 징수실적 거양

□ 가로환경 개선

- 내 용 : 통행불편 및 도시미관을 저해하는 노점상 노상적치물 정비
- 노점상 및 가로시설물 현황(2000. 5. 31현재)

(단위 : 개소)

| 계     | 노점상   | 노상적치물 | 가로판매점 | 구두담이박스 | 토큰박스 |
|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 3,925 | 1,207 | 2,381 | 171   | 133    | 33   |

○ 추진계획

- 절대금지구역 : 강력단속
- 상대금지구역 : 자율정비 추진
- 노선별 단속책임 지정관리 : 3개구역 14개소 등

□ 공공용지의 취득 및 손실보상

- 내 용 : 설명회 및 이해설득으로 보상협의율을 제고하여 조기보상 완료

| 계  | 사 업 장 수 |    |    |    |       |    |    |    | 사업비(백만원) |        |       |
|----|---------|----|----|----|-------|----|----|----|----------|--------|-------|
|    | 시 사 업   |    |    |    | 구 사 업 |    |    |    | 계        | 시비     | 구비    |
|    | 소계      | 계속 | 이월 | 신규 | 소계    | 계속 | 이월 | 신규 |          |        |       |
| 17 | 6       | 3  | -  | 3  | 11    |    | 6  | 5  | 15,050   | 13,800 | 1,250 |

○ 추진계획

- 보상기간 최대한 단축 : 6개월 → 4~5개월
- 보상협의율 제고 : 70~80% → 90% 이상
- 보상관련 소송 승소율 제고 : 70% → 80% 이상

□ 사설안내표지 일제정비

○ 내 용 : 도로상에 무질서하게 설치되어 도시미관을 저해하고 통행에 불편을 초래하고 있어 정비와 규격화로 도시미관 개선 및 교통 안전 도모

○ 대 상 : 368(허가112, 무허가256)

○ 추진계획

- 무허가 표지판은 자진철거 유도
- 허가된 표지판 중 탈색·훼손된 경우 동일규격의 모델로 교체
- 자진철거 불응시 변상금 부과 및 강제철거



2000年度  
主要業務推進現況

土 木 課

# 2000년 주요업무 추진현황

## I. 2000 사업계획 세부추진 방향

### 1. 목 표

- 도시 기반시설 확충으로 지역발전 촉진 및 구민의 삶의 질 향상
- 하수시설 확충 및 정비로 시민생활 안전 확보
- 보행자 안전 위주의 쾌적한 가로환경 조성
- 밝은 밤거리 조성으로 구민의 생활안전 확보
- 맑고 깨끗한 지하수 환경기반 조성

### 2. 2000 건설사업 총괄

(단위 : 백만원)

| 사업명  | 사업비<br>총 계      | 2000 사업비        |                | '99이월<br>사업비   | 비 고 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
|      |                 | 시 비             | 구 비            |                |     |
| 계    | 27,473<br>(48건) | 18,693<br>(18건) | 2,846<br>(20건) | 5,934<br>(10건) |     |
| 도로건설 | 6,539<br>(11건)  | 1,674<br>(4건)   | -              | 4,865<br>(7건)  |     |
| 하수관리 | 12,554<br>(13건) | 10,823<br>(7건)  | 751<br>(5건)    | 980<br>(1건)    |     |
| 도로관리 | 7,541<br>(16건)  | 5,545<br>(5건)   | 1,936<br>(10건) | 60<br>(1건)     |     |
| 도로조명 | 839<br>(8건)     | 651<br>(2건)     | 159<br>(5건)    | 29<br>(1건)     |     |

### 3. 2000 예산사업 현황

(단위 : 백만원)

| 분야별   | 사업비 | 계               | 시 비             | 구 비            | 비 고 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 계     |     | 21,539<br>(38건) | 18,693<br>(18건) | 2,846<br>(20건) |     |
| 도로 건설 |     | 1,674<br>(4건)   | 1,674<br>(4건)   | -              |     |
| 하수 관리 |     | 11,574<br>(12건) | 10,823<br>(7건)  | 751<br>(5건)    |     |
| 도로 관리 |     | 7,481<br>(15건)  | 5,545<br>(5건)   | 1,936<br>(10건) |     |
| 도로 조명 |     | 810<br>(7건)     | 651<br>(2건)     | 159<br>(5건)    |     |

## II. 주요사업 추진

### 1. 도로 건설 사업

(단위 : 백만원)

| 연번         | 사업명                         | 사업개요               | 사업비(백만원) |       |       | 사업기간                    | 추진실적<br>(공정%) | 비고             |
|------------|-----------------------------|--------------------|----------|-------|-------|-------------------------|---------------|----------------|
|            |                             |                    | 계        | 사비    | 구비    |                         |               |                |
|            | 합계<br>(11건)                 |                    | 6,539    | 4,879 | 1,660 |                         |               |                |
| '99<br>이월  | 소계<br>(7건)                  |                    | 4,865    | 3,205 | 1,660 |                         |               |                |
| 1          | 가회동~감사원간(1차)<br>도로개설        | B=20m<br>L=205m    | 1,330    | 1,330 | -     | '99.10.<br>~<br>2000.10 | 30%           |                |
| 2          | 필운동~신교동간<br>도로개설공사          | B=12~15m<br>L=770m | 2,000    | 1,400 | 600   | '98.3.~<br>2000.9.      | 80%           | 사비70%<br>구비30% |
| 3          | 창경궁로~대학로간<br>도로개설공사(1차)     | B=20m<br>L=370m    | 475      | 475   |       | '99.4.~<br>'99.11.      | 100%          |                |
| 4          | 외룡동93~권농동120간<br>도로개설공사     | B=6~7m<br>L=243m   | 330      |       | 330   | 2000.5~<br>2000.12      | 10%           |                |
| 5          | 명륜3가 90-180간<br>외1개소 도로개설공사 | B=6m<br>L=243m     | 400      |       | 400   | 2000.5~<br>2000.12      | 15%           |                |
| 6          | 필운동19~104간<br>도로개설공사        | B=6m<br>L=90m      | 130      |       | 130   | 2000.5~<br>2000.12      | 10%           |                |
| 7          | 송인동 191-347간<br>도로개설공사      | B=6m<br>L=70m      | 200      |       | 200   | 2000.5~<br>2000.12      | 5%            |                |
| 2000<br>도로 | 소계<br>(4건)                  |                    | 1,674    | 1,674 |       |                         |               |                |
| 1          | 가회동사무소~감사원간<br>도로개설(2차)     | B=20m<br>L=205m    | 728      | 728   | -     | 2000.5~<br>2000.12      | 15%           |                |
| 2          | 창경궁로~대학로간<br>도로개설(2차)       | B=20m<br>L=370m    | 400      | 400   | -     | 2000.3~<br>2000.11      | 45%           |                |
| 3          | 세검정교차로 확장공사                 | B=25~30m<br>L=86m  | 300      | 300   |       | 2000.9~<br>2000.12      |               |                |
| 4          | 세검정초등학교 방음벽<br>설치공사         | B=6m<br>L=90m      | 246      | 246   |       | 2000.9~<br>2000.12      |               |                |

## 2. 하수 관리 사업

(단위 : 백만원)

| 연번         | 사업명                          | 사업개요                               | 사업비 (백만원) |        |     | 사업기간               | 추진실적<br>(공정%) | 비고 |
|------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----|--------------------|---------------|----|
|            |                              |                                    | 계         | 시비     | 구비  |                    |               |    |
|            | 계 13 건                       |                                    | 12,554    | 11,803 | 751 |                    |               |    |
|            | 소계<br>(1건)                   |                                    | 980       | 980    |     |                    |               |    |
| 99<br>이월   | 홍제천 정비공사                     | 건물철거 13동<br>공원조성 630m <sup>2</sup> | 980       | 980    |     | '99. 9.<br>~2000.9 | 90            |    |
| 2000<br>하수 | 소계<br>(12건)                  |                                    | 11,574    | 10,823 | 751 |                    |               |    |
| 1          | 종로1가~소격동55<br>하수암거 보수공사      | □5.2×2.5m<br>L = 200m              | 500       | 500    |     | 2000.<br>4~11      | 60            |    |
| 2          | 인사동길 하수암거<br>개량공사            | □ 2×2m<br>L = 630m                 | 2,300     | 2,300  |     | 99. 11<br>~2000.6  | 98            |    |
| 3          | 인사동길외1개소<br>역사탐방로조성공사        | B = 10~15m<br>L = 1,730m           | 4,643     | 4,643  |     | 99. 11<br>~2000.7  | 30            |    |
| 4          | 청계천 복개구조물<br>준설공사            | V=1,845m <sup>3</sup>              | 200       | 200    |     | 2000.<br>2~6       | 100           |    |
| 5          | 신문로횡단하수암거<br>보수공사            | □ 2.8 x 2.8m<br>×2련<br>L = 300m    | 980       | 980    |     | 2000.4<br>~2001.1  | 10            |    |
| 6          | 효자배수분구 하수<br>관리정비공사<br>(비굴착) | D=300~700mm<br>L = 1,970m          | 1,200     | 1,200  |     | 2000.<br>4 ~ 12    | 30            |    |
| 7          | 효자배수분구 하수<br>관리정비공사<br>(굴착)  | D=300~1000mm<br>L = 2,600m         | 1,000     | 1,000  |     | 2000.<br>5 ~ 12    | 40            |    |
| 8          | 관내 하수도<br>준설공사               | V = 1390m <sup>3</sup>             | 250       |        | 250 | 2000.<br>5 ~ 12    | 60            |    |
| 9          | 관내하수시설물<br>보수공사              | D = 300~800mm<br>L = 470m          | 200       |        | 200 | 2000<br>4 ~ 12     | 70            |    |
| 10         | 교북동86~100간<br>하수도개량공사        | D = 450m<br>L = 94m                | 63        |        | 63  | 2000.<br>4 ~ 7     | 90            |    |
| 11         | 예지동269~100간<br>하수도개량공사       | D = 450~600mm<br>L = 166m          | 78        |        | 78  | 2000.<br>4~7       | 80            |    |
| 12         | 승인동2-25~22-8간<br>개량공사        | D = 600~800mm<br>L = 228m          | 160       |        | 160 | 2000<br>4~9        | 80            |    |

## 3. 도로 관리 사업

(단위 : 백만원)

| 연번         | 사업명                         | 사업개요                        | 사업비 (백만원) |       |       | 사업기간                    | 추진실적<br>(공정%) | 비고       |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------------------------|---------------|----------|
|            |                             |                             | 계         | 시비    | 구비    |                         |               |          |
|            | 합계<br>(16건)                 |                             | 7,541     | 5,545 | 1,996 |                         |               |          |
| '99<br>이월  | 소계<br>(1건)                  |                             | 60        |       | 60    |                         |               |          |
| 1          | 소나무거리 보도조성공사                | 보도확장<br>A=6.8a              | 60        |       | 60    | '99.12.16<br>~2000.6.16 | 100%          |          |
| 2000<br>도로 | 소계<br>(15건)                 |                             | 7,481     | 5,545 | 1,936 |                         |               |          |
| 1          | 경북공길 역사문화 탐방로<br>조성공사       | B = 3~8m<br>L = 1,650       | 2,762     | 2,762 |       | 2000.2.18<br>~9.30      | 10%           |          |
| 2          | 세검8교 재 설치공사<br>(용역)         | B=43m<br>L=20m              | 20        |       | 20    | 2000.6.15<br>~8.15      | 5%            |          |
| 3          | 새운상가 테크 보수공사<br>(용역)        | B=9.6m<br>L=133m            | 18        |       | 18    | 2000.6.15<br>~8.15      | 5%            |          |
| 4          | 관내도로굴착복구공사<br>(연간단가)        |                             | 700       |       | 700   | 2000.5.4<br>~12.31      | 25%           |          |
| 5          | 관내도로 보수공사<br>(연간단가)         | 포장<br>A=250a                | 400       |       | 400   | 2000.5.3<br>~12.31      | 40%           |          |
| 6          | 관내도로시설물보수공사<br>(연간단가)       | 시설물 42개소                    | 200       |       | 200   | 2000.5.16<br>~12.31     | 50%           |          |
| 7          | 창산동23-330~23-3간<br>도로정비공사   | B=8m<br>L=80m               | 100       |       | 100   | 2000.2.22<br>~12.31     | 10%           |          |
| 8          | 통인동등12개소 도로정비<br>공사         | 이스콘덱트우기<br>A=242a           | 300       | 300   |       | 2000.6.17               |               | 계약<br>의뢰 |
| 9          | 평창4.5교 정밀안전진단<br>용역         | B=5~7m<br>L=111m            | 50        |       | 50    | 2000.6.10<br>~ 9.7      | 5%            |          |
| 10         | 지하철 6.7호선 비개착<br>구간 보도정비    | B=5m<br>L=360m              | 96        | 48    | 48    | 2000.8<br>~ 12.31       |               |          |
| 11         | 청계천화물조업주차<br>개선사업           |                             | 500       | 500   |       | 2000.9<br>~ 12.31       |               |          |
| 12         | 동대문상가주변<br>보도정비공사           |                             | 300       | 300   |       | 2000.9<br>~ 12.31       |               |          |
| 13         | 관내맨홀정비공사                    | 맨홀보수<br>120개소               | 100       |       | 100   | 2000.9<br>~ 12.31       |               |          |
| 14         | 간선도로교통종합개선<br>공사 종로측외 1개소   | 보도축소3개소<br>장애자보도<br>포장 15개소 | 825       | 825   |       | 2000.8<br>~ 12.31       |               |          |
| 15         | 성균관길/대명사거리<br>역사문화 탐방로 조성공사 | B=9~12m<br>L=580m           | 1,110     | 810   | 300   | 2000.8<br>~ 12.31       |               |          |

### 4. 도로 조명 사업

(단위 : 백만원)

| 연번         | 사업명                     | 사업개요  | 사업비 (백만원) |     |     | 사업기간                  | 추진실적<br>(공정%) | 비고       |
|------------|-------------------------|---|-----------|-----|-----|-----------------------|---------------|----------|
|            |                         |   | 계         | 시비  | 구비  |                       |               |          |
|            | 합계<br>(8건)              |   | 839       | 651 | 188 |                       |               |          |
| '99<br>이월  | 소계<br>(1건)              |   | 29        |     | 29  |                       |               |          |
| 1          | 소나무거리에 어울리는<br>보행등설치외1건 | · 보행등설치8본<br>· 가로등9본                                      | 29        |     | 29  | '99.12.<br>~2000.6.14 | 100%          |          |
| 2000<br>도로 | 소계<br>(7건)              |   | 810       | 651 | 159 |                       |               |          |
| 1          | 종묘길 가로등 개량<br>공사        | · 가로등설치10본<br>· 분전함설치1개소                                  | 25        |     | 25  | 2000.5.15<br>~ 10.14  | 10            |          |
| 2          | 가로등시설물 보수공사             | · 보조가로등10<br>5등<br>· 분전함4면개량                              | 49        |     | 49  | 2000.5.9<br>~ 8.16    | 30            |          |
| 3          | 역사문화탕방로 전기<br>공사        | · 조명등224등<br>· 방송설비<br>기타공사                               | 370       | 370 |     | 2000.5.2<br>~ 9.28    | 15            |          |
| 4          | 보안등 보수공사                | · 램프안정기교체<br>· 보안등이설                                      | 50        |     | 50  | 2000.5.13<br>~ 12.31  | 25            |          |
| 5          | 창경궁로~대학로간<br>가로등 설치공사   | · 가로등기초설치<br>· 가로등설치10본                                   | 5         |     | 5   | 2000.5.15<br>~ 6.14   | 10            |          |
| 6          | 관철·관수동 보행등<br>정비        | · 보행등교체13개소<br>· 보행등신설5개소<br>· 보행등철거2개소                   | 30        |     | 30  |                       |               | 공중       |
| 7          | 경복궁길 가로등 개량<br>외2종공사    | · 경복궁길 가로등<br>67본<br>· 경복궁돌담특사등<br>58등<br>· 돈화문로특사등<br>4등 | 281       | 281 |     |                       |               | 적려<br>삼중 |

## 5. 비 예산사업(공공 근로사업)

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명                | 사업개요  | 사업비 | 사업기간                | 추진실적<br>(공정 %) | 비고           |
|----|--------------------|---|-----|---------------------|----------------|--------------|
| 계  | 2건                 |   | 139 |                     |                |              |
| 1  | 공공근로사업<br>(도로관리분야) | - 도로정비 A=43a<br>- 경계석정비 L=260m<br>- 측구정비 L=121m           | 107 | 2000.1.10<br>~ 6.9  | 100%           | 4,850명<br>참여 |
| 2  | 공공근로사업<br>(하천준설)   | • 홍제천, 구기천<br>B=5~15m<br>L=1,100<br>V=1,800m <sup>3</sup> | 32  | 2000.1.10<br>~ 6.30 | 100%           | 2,196명<br>참여 |

## 6. 맑고 깨끗한 지하수 환경기반 조성 및 수익사업

## □ 지하수 방치폐공 일제정비 5개년계획 추진

## ○ 관리목표

- 방치폐공 590개소 일제조사('97~'99)
- 방치폐공 원상복구 완료(2000~2001)

## ○ 추진방향

- 제1단계 : 방치폐공 현황 및 현장 표본조사('97년완료)
- 제2,3단계 : 전수조사 완료 및 원상복구 병행 추진('98~'99)
- 제4,5단계 : 미복구50개소, 미조사90개소, 원상복구 및 일제조사 병행(2000년~2001년)

## ○ 추진계획 및 실적

- 대 상 : 미복구50개소 원상복구(상반기)  
미조사90개소 일제조사(하반기)
- 추진기간 : 2000. 3 ~ 2001. 12. 31
- 소요예산 : 비예산사업(지하수 이용자 부담)
- 추진실적 : 2000.6.1현재 재사용 및 원상복구36개소 완료,

□ 2000년 경영 수익사업 추진

- 사업내용 및 목표 (년간 총매출액 : 450만원)
  - 지하수 관리연보 광고유치 : 450 만원
  - 지하수 관리연보 판매 : 400 만원
- 추진계획 및 실적
  - 추진기간 : 2000.3.1 ~ 2000.12.31
  - 사업방법 : 연보 광고유치→연보발행→연보홍보→연보판매
  - 소요예산 : 5,250천원(구비)
  - 추진실적 : 2000.6.1현재 광고계약 완료17건 총450만원

Ⅲ. 재해대책 업무 추진

1. 제설대책

□ 제설작업 개요

- 제설기간 : 1999. 11. 15~2000. 3. 15
- 작업노선 : 62개노선 49.7km 10,630 a

□ 제설작업 추진현황

- 제설함 설치 : 총 44개소(염화칼슘함 : 12, 모래함 : 32)
- 장비현황 : 총 104대

| 유 니 목 | 덤프트럭 | 살포기 | 청 소 차 량 | 비 고    |
|-------|------|-----|---------|--------|
| 4     | 6    | 6   | 69      | 행정차량19 |

○ 자재현황

- 염화칼슘 : 확보량 16,482대 (사용량 12,763대, 잔량 3,719대)
- 모     래 : 확보량 100m<sup>3</sup> (사용량 63m<sup>3</sup>, 잔량 37m<sup>3</sup>)

□ 제설작업 중점추진내용

- 제설작업 계획 수립추진 : '99. 11. 15일부터
  - 교육실시 : 제설담당 교육 ('99. 11. 26)
  - 제설봉사반 발족 : 주민자율 (316개반, 3,735명)  
공익요원 ( 8개반, 80명)
  - 제설평가지행 : 우수 동사무소 포상금 230만원 지급
- 기습강설따른 완벽한 제설작업실시 (200.1.19.02:00 적설량3.0cm)
  - 기상정보 사전입수 (위성수신기, K-WEATHER)
  - 제설대책본부 상황실 가동 및 제설작업반 강설즉시 제설출동
  - 신속한 초동제설 실시로 청와대 관계자의 치하

2. 수방대책

□ 방재행정 목표

- 예방위주의 자연재해 종합대응
- 시민의 안전욕구 증대에 따른 예방위주의 방재행정
- 21세기 정보화 시대에 걸맞는 방재 전산화·과학화
- 재해 관리의 종합적 체계개선 및 안전한 방재계획 수립

□ 수방대책 추진내용

- 추진현황
  - 재해사전대비 추진 : 2000. 3. 15. ~ 2000. 5. 15
  - 최종점검 및 보완 : 2000. 5. 16. ~ 2000. 6. 14
  - 재해대책본부 운영 : 2000. 6. 15 ~ 2000. 10. 15
- 재해사전대비 업무시행
  - 노후 하수관 개량공사 및 저지대 준설 장마전 완료
- 수해 취약시설(지역)의 사전점검·정비  
(위험시설, 대형공사장 전문가합동점검 실시)
- 수방물자와 구호·방역물자의 비축
- 지속적 홍보 및 실질적 교육훈련 실시
- 지하 보·차도등 침수 예상도로의 안전과 교통대책 강화
- 피해발생시 응급복구·구호·방역·급수·청소대책추진

#### Ⅳ. 도로시설물 안전관리

□ 대상 - 41개소

| 일반교량 | 터 널 | 지하차도 | 지하보도 | 보도육교 | 고가차도 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 19   | 0   | 1    | 4    | 17   | -    |

□ 안전관리 추진내용

○ 안전점검의 내실화

- 년2회 이상 담당자 시설물점검 및 관리상황 직접 확인 점검
- 안전상 위험 또는 위해요인 발견시 보수, 보강 조치시 까지 수시 현장 점검
- 현장 시정사항은 즉시 조치, 정밀검토시 보완사항은 신속하게 근원적 조치를 강구

- 강설 및 결빙시 위험시설물은 주 2회 이상 순찰 점검

○ 긴급보수 자재확보

○ 긴급복구 동원태세를 확립하여 24시간 행정기능 유지

- 도로시설 복구 기동반 운영 - 4개반 14명

※ 교통불편 최소화 : 야간공사 시행

# 2000 주요업무 추진계획

## □ 주요업무 추진방향

- 도로개설 확충으로 지역발전 도모 및 구민의 삶의 질 향상
- 하수시설 확충 및 정비로 시민생활 안전 확보
- 보행자 안전 위주의 쾌적한 보행환경조성
- 밝은 밤거리 조성으로 구민의 안전생활 확보
- 부실공사 방지 추진(중간검사제, 공사실명제, 불법하도급 근절)
- 재해없는 종로 만들기 구현(수방,제설대책 추진)
- 효율적 지하수보존관리 및 쾌적한 환경기반 조성

## □ 신규·주요시책사업

[2000년 주요건설사업 총괄현황]

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 사업비 총계 |        | 소요예산 현황(2000년) |        |     |       | 비 고 |
|------|--------|--------|----------------|--------|-----|-------|-----|
|      | 건수     | 금액     | 시 비            |        | 구 비 |       |     |
|      |        |        | 건수             | 금액     | 건수  | 금액    |     |
| 계    | 42     | 25,422 | 21             | 20,748 | 21  | 4,674 |     |
| 도로건설 | 11     | 6,539  | 6              | 4,879  | 5   | 1,660 |     |
| 하수관리 | 9      | 9,831  | 6              | 9,303  | 3   | 528   |     |
| 도로관리 | 15     | 8,242  | 7              | 5,915  | 8   | 2,327 |     |
| 도로조명 | 7      | 810    | 2              | 651    | 5   | 159   |     |

[도로건설 분야]

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명                      | 사업개요               | 사업비   |       |       | 공사기간                | 비고 |
|----|--------------------------|--------------------|-------|-------|-------|---------------------|----|
|    |                          |                    | 계     | 시비    | 구비    |                     |    |
| 소계 |                          |                    | 6,539 | 4,879 | 1,660 |                     |    |
| 1  | 가회동~감사원간(1차) 도로개설        | B=20m<br>L=205m    | 1,330 | 1,330 | -     | '99.10.~<br>2000.10 |    |
| 2  | 필운동~신교동간 도로개설공사          | B=12~15m<br>L=770m | 2,000 | 1,400 | 600   | '98.3.~<br>2000.9.  |    |
| 3  | 창경궁로~대학로간 도로개설공사(1차)     | B=20m<br>L=370m    | 475   | 475   |       | '99.4.~<br>'99.11.  |    |
| 4  | 와룡동93~권농동120간 도로개설공사     | B=6~7m<br>L=243m   | 330   |       | 330   | 2000.5~<br>2000.12  |    |
| 5  | 명륜3가 90-180간 외1개소 도로개설공사 | B=6m<br>L=243m     | 400   |       | 400   | 2000.5~<br>2000.12  |    |
| 6  | 필운동19~104간 도로개설공사        | B=6m<br>L=90m      | 130   |       | 130   | 2000.5~<br>2000.12  |    |
| 7  | 송인동 191-347간 도로개설공사      | B=6m<br>L=70m      | 200   |       | 200   | 2000.5~<br>2000.12  |    |
| 8  | 가회동사무소~감사원간 도로개설(2차)     | B=20m<br>L=205m    | 728   | 728   | -     | 2000.5~<br>2000.12  |    |
| 9  | 창경궁로~대학로간 도로개설(2차)       | B=20m<br>L=370m    | 400   | 400   | -     | 2000.3~<br>2000.11  |    |
| 10 | 세검정교차로 확장공사              | B=25~30m<br>L=86m  | 300   | 300   |       | 2000.9~<br>2000.12  |    |
| 11 | 세검정초등학교 방음벽 설치공사         | B=6m<br>L=90m      | 246   | 246   |       | 2000.9~<br>2000.12  |    |

## [하수관리 분야]

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명                          | 사업개요                            | 사업비   |       |     | 공사기간               | 비고 |
|----|------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----|--------------------|----|
|    |                              |                                 | 계     | 시비    | 구비  |                    |    |
| 소계 |                              |                                 | 9,831 | 9,303 | 528 |                    |    |
| 1  | 홍제천 정비공사                     | 건물철거 13동<br>공원조성 630㎡           | 980   | 980   |     | '99. 9.<br>~2000.9 |    |
| 2  | 종로1가~소격동55<br>하수암거 보수공사      | □5.2×2.5m<br>L = 200m           | 500   | 500   |     | 2000.<br>4 ~ 11    |    |
| 3  | 인사동길외1개소<br>역사탐방로조성공사        | B = 10~15m<br>L = 1,730m        | 4,643 | 4,643 |     | '99.11<br>~2000.7  |    |
| 4  | 신문로횡단하수암거<br>보수공사            | □ 2.8 x 2.8m<br>×2련<br>L = 300m | 980   | 980   |     | 2000.4<br>~2001.1  |    |
| 5  | 효자배수분구 하수<br>관리정비공사<br>(비굴착) | D=300~700mm<br>L = 1,970m       | 1,200 | 1,200 |     | 2000.<br>4 ~ 12    |    |
| 6  | 효자배수분구 하수<br>관리정비공사<br>(굴착)  | D=300~1000mm<br>L = 2,600m      | 1,000 | 1,000 |     | 2000.<br>5~12      |    |
| 7  | 관내 하수도<br>준설공사               | V = 1390㎥                       | 250   |       | 250 | 2000.<br>5.~12     |    |
| 8  | 관내하수시설물<br>보수공사              | D = 300~800mm<br>L = 470m       | 200   |       | 200 | 2000<br>4 ~ 12     |    |
| 9  | 예지동269~100간<br>하수도개량공사       | D = 450~600mm<br>L = 166m       | 78    |       | 78  | 2000.<br>4~7       |    |

[도로관리 분야]

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명                         | 사업개요                       | 사업비   |       |       | 공사기간                | 비고 |
|----|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|---------------------|----|
|    |                             |                            | 계     | 시비    | 구비    |                     |    |
| 소계 |                             |                            | 8,242 | 5,915 | 2,327 |                     |    |
| 1  | 경북궁길 역사문화 탐방로 조성공사          | B = 3~8m<br>L = 1,650      | 2,762 | 2,762 | -     | 2000.2.18<br>~9.30  |    |
| 2  | 세검8교 재 설치공사                 | B=43m<br>L=20m             | 370   | 370   |       | 2000.6.15<br>~8.15  |    |
| 3  | 세운상가 테크 보수공사                | B=9.6m<br>L=133m           | 429   |       | 429   | 2000.6.15<br>~8.15  |    |
| 4  | 관내도로굴착복구공사<br>(연간단가)        |                            | 700   |       | 700   | 2000.5.4<br>~12.31  |    |
| 5  | 관내도로 보수공사<br>(연간단가)         | 포장<br>A=250a               | 400   |       | 400   | 2000.5.3<br>~12.31  |    |
| 6  | 관내도로시설물보수공사<br>(연간단가)       | 시설물 42개소                   | 200   |       | 200   | 2000.5.16<br>~12.31 |    |
| 7  | 창신동23-330~23-3간<br>도로정비공사   | B=8m<br>L=80m              | 100   |       | 100   | 2000.2.22<br>~12.31 |    |
| 8  | 통인동등12개소 도로정비<br>공사         | 아스콘덧씌우기<br>A=242a          | 300   | 300   |       | 2000.8<br>~12.31    |    |
| 9  | 평창4.5교 정밀안전진단<br>용역         | B=5~7m<br>L=111m           | 50    |       | 50    | 2000.6.10<br>~9.7   |    |
| 10 | 지하철 6.7호선 비개<br>착구간 보도정비    | B=5m<br>L=360m             | 96    | 48    | 48    | 2000.8<br>~12.31    |    |
| 11 | 청계천화물조업주차<br>개선사업           |                            | 500   | 500   |       | 2000.9<br>~12.31    |    |
| 12 | 동대문상가주변<br>보도정비공사           |                            | 300   | 300   |       | 2000.9<br>~12.31    |    |
| 13 | 관내맨홀정비공사                    | 맨홀보수<br>120개소              | 100   |       | 100   | 2000.9<br>~12.31    |    |
| 14 | 간선도로교통종합개선<br>공사 종로측외 1개소   | 보도축소3개소<br>장애자보도포장<br>15개소 | 825   | 825   |       | 2000.8<br>~12.31    |    |
| 15 | 성균관길/대명사거리<br>역사문화 탐방로 조성공사 | B=9~12m<br>L=580m          | 1,100 | 810   | 300   | 2000.8<br>~12.31    |    |

## [도로조명 분야]

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명                   | 사업개요  | 사업비 |     |     | 공사기간                 | 비고 |
|----|-----------------------|---|-----|-----|-----|----------------------|----|
|    |                       |   | 계   | 시비  | 구비  |                      |    |
| 소계 |                       |   | 810 | 651 | 159 |                      |    |
| 1  | 중요길 가로등 개량<br>공사      | · 가로등설치10본<br>· 분전함설치1개소                                  | 25  |     | 25  | 2000.5.15<br>~ 10.14 |    |
| 2  | 가로등시설물 보수공사           | · 보조가로등10<br>5등<br>· 분전함4면개량                              | 49  |     | 49  | 2000.5.9<br>~ 8.16   |    |
| 3  | 역사문화탕방로 전기<br>공사      | · 조명등224등<br>· 방송설비<br>기타공사                               | 370 | 370 |     | 2000.5.2<br>~ 9.28   |    |
| 4  | 보안등 보수공사              | · 램프안정기교체<br>· 보안등이설                                      | 50  |     | 50  | 2000.5.13<br>~ 12.31 |    |
| 5  | 창경궁로~대학로간<br>가로등 설치공사 | · 가로등기초설치<br>· 가로등설치10본                                   | 5   |     | 5   | 2000.5.15<br>~ 6.14  |    |
| 6  | 관철·관수동 보행등<br>정비      | · 보행등교체13개소<br>· 보행등신설5개소<br>· 보행등철거2개소                   | 30  |     | 30  | 2000.7<br>~ 12.31    |    |
| 7  | 경복궁길 가로등 개량<br>외2종공사  | · 경복궁길 가로등<br>67본<br>· 경복궁돌담특사<br>등58등<br>· 돈화문로특사등<br>4등 | 281 | 281 |     | 2000.7<br>~ 12.31    |    |



2000年度  
主要業務推進現況

交通行政課

## 2000년도 주요업무추진현황

### □ 공영노외주차장 설치

- 추진실적 - 6개소(완료1, 추진중5)
- 사업개요

(완 료)

(단위 : 백만원)

| 연<br>번 | 위<br>치   | 면적<br>(㎡) | 소 요 예 산 |     | 주차<br>대수 | 건립<br>형태 | 준공일       |
|--------|----------|-----------|---------|-----|----------|----------|-----------|
|        |          |           | 부지매입    | 공사비 |          |          |           |
| 1      | 명륜3가1-29 | 386.1     | 406     | 43  | 19       | 차주식      | 2000.6.14 |

(추진중)

(단위 : 백만원)

| 연<br>번 | 위<br>치           | 면적<br>(㎡) | 부지매입  | 주차<br>대수 | 매입일자      | 비고             |
|--------|------------------|-----------|-------|----------|-----------|----------------|
| 계      |                  | 3,283.1   | 5,285 | 169      |           |                |
| 1      | 창신동23-343        | 725.0     | 552   | 54       | '99. 7. 9 | 2000.7<br>준공예정 |
| 2      | 명륜1가 5-14<br>외 7 | 1,169.0   | 1,491 | 59       | '99.10. 5 | 2000.8<br>발주   |
| 3      | 효자동68-1          | 790.1     | 2,049 | 29       | '99.12.27 | 2000.7<br>발주   |
| 4      | 동승동31-35         | 420.8     | 911   | 20       | '99.12.27 | 2000.9<br>발주   |
| 5      | 송인동72-170        | 178.2     | 282   | 7        | 2000.4.10 | 2000.9<br>발주   |

## □ 노상주차장 설치

(개소/구획수)

| 구 분              | 총 구획수     | 노 상 주 차 장 |        |           |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                  |           | 거주자 우선    | 공 영    | 무료 주차구획   |
| 계                | 287/3,802 | 55/1,658  | 17/464 | 215/1,680 |
| '99년 말           | 258/3,547 | 27/1,425  | 16/442 | 215/1,680 |
| 2000.5.31<br>현 재 | 29/255    | 28/233    | 1/22   | 0         |

## □ 2000. 교통유발부담금 부과 및 징수

## ○ 사업개요

- 부과대상 : 연면적 1,000㎡이상 시설물(비부과 대상면적 제외)
- 단위부담금 : 1㎡당 350원
  - ※ 연면적 3,000㎡이상 시설물은 1㎡당 700원
- 부과기준 : 2000.7.31
- 납 기 : 2000.9.16 ~ 9.30

## ○ 추진내용

- '99.6.1 ~ 2000. 5 .31까지 신규 사용승인 건물 발취 : 18건
- 2000년도 부과대상 시설물 용도 현황 조사 실시 : 1,253건

## □ 미끄럼방지시설 설치

- 2000.5.31 현재 : 4개소 480㎡

□ 2000. 자동차과태료 부과(2000.5.31일 현재)

(단위 : 천원)

| 구 분    | 목 표 액   | 부과액     | 5월말<br>징수누계 | 진도율(%) |
|--------|---------|---------|-------------|--------|
| 계      | 400,450 | 379,527 | 135,368     | 33.8%  |
| 자동차과태료 | 340,450 | 257,602 | 114,387     | 33.5%  |
| 책임보험   | 60,000  | 121,925 | 20,981      | 34.9%  |

# 2000년도 주요업무추진계획

## □ 공영노외주차장 건립

○ 추진목표 - 6개소

○ 사업개요

(단위 : 백만원)

| 번호 | 위치                               | 면적<br>(㎡)           | 소요예산                        |       | 주차<br>대수 | 건립형태        | 비고                       |
|----|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------|--------------------------|
|    |                                  |                     | 부지매입                        | 공사비   |          |             |                          |
| 계  |                                  | 3,669.2<br>(1,108평) | 5,691<br>(구비5,391<br>사비300) | 1,893 | 188      |             |                          |
| 1  | 명륜3가1-29                         | 386.1㎡<br>(117평)    | 406                         | 43    | 19       | 자주식1층       | '99부지<br>매입완료            |
| 2  | 창신3동23-<br>343(낙산APT철거<br>부지19동) | 725.0㎡<br>(219평)    | 552                         | 270   | 54       | 자주식1층<br>2단 | "                        |
| 3  | 명륜1가5-14<br>외 7필지                | 1,169.0㎡<br>(353평)  | 1,491<br>(구비1,191<br>사비300) | 1,400 | 59       | 자주식2층<br>3단 | "                        |
| 4  | 효자동68-1<br>(전남일보사)               | 790.1㎡<br>(239평)    | 2,049                       | 100   | 29       | "           | '99.10.25<br>구의회<br>취득승인 |
| 5  | 동승동31-35                         | 420.8㎡<br>(127평)    | 911                         | 50    | 20       | "           | "                        |
| 6  | 송인1동72-170                       | 178.2㎡<br>(53평)     | 282                         | 30    | 7        | "           |                          |

□ 노상주차장 확대 설치

- 설치목표 : 300구획(1,100만원)
- 추진계획
  - 2000. 6 : 이면도로 주차구획 설치 계획수립
  - 2000. 7 ~ 8 : 현장조사 및 공사발주
  - 2000. 8 : 구획선 설치

□ 교통유발부담금 부과징수

○ 추진배경

대도시 교통난 완화대책 일환으로 교통유발의 원인이 되는 일정규모 이상의 시설물 소유자에게 부과·징수하여 교통시설의 신설개량 및 확충 재원으로 활용코자 함.

○ 부과·징수 개요

- 부과대상 : 비부과 면적을 제외한 건축연면적 합계가 1,000㎡이상인 시설물 소유자
- 부과기준일 : 2000. 7.31
- 납부기한 : 2000.9.16 ~9.30일

□ 미끄럼방지시설 설치

○ 현 황

(단위 : 천원)

| 설치 계획 |        | 예산      | 비고 |
|-------|--------|---------|----|
| 개소    | 면적     |         |    |
| 10    | 2,680㎡ | 124,800 |    |

□ 2000. 자동차과태료 징수 계획

- 자동차등록관리법 위반(신규,이전,변경 등) 과태료
  - 2,982건 ₩340,450천원
- 자동차책임보험과태료
  - 1,000건 ₩60,000천원



2000年度  
主要業務推進現況

交通指導課

## 2000년도 주요업무추진현황

### □ 불법주·정차 단속의 효율적 운영

- 추진목표 : 142,000건
- 추진실적
  - 단속인원 : 23개조 54명(구-13개조 43명, 동-10개조 11명)
    - 2000. 1. 10 : 여자단속원 전직원 구분청 근무 완료(별관)
  - 단속건수 : 53,653건(37.8%)
  - 단속차량 : 3대(승합차 2대, 승용차 1대)
    - 2000. 5. 25 경차 신규 대체 구입 완료
  - 민원다발 및 상습주차지역 특별근무조 편성운영
    - 특별근무 : 2000. 2. 1 ~ 계속
    - 조간단속 : 초등학교주변 6개소 및 옥인APT주변 (1개조 4명)
    - 야간단속 : 간선도로 및 청계천, 대학로지역 등 (1개조 4명)

### □ 주·정차 단속 전산화사업 추진

- 추진배경 : 무선통신 전송시스템 도입으로 원스톱 민원처리
- 추진개요
  - 설치장비 : 주차위반과태료통합관리시스템 1식, 디스크어레이 1식  
무선데이터통신 장비(스마트폰 등)
  - 설치장소 : 구청 본관 5층 주·정차 민원실
  - 소요예산 : 50,000천원
- 추진일정
  - 2000. 2 : 주차관리 전산화사업 내역서 자료 수합
  - 2000. 3 : 주차관리 통합전산 프로그램 개발 자료 분석
  - 2000. 4 : 서울시 통합 전산 프로그램 개발 권고내역 조정
  - 2000. 5 : 주차관리 전산화사업 추진계획 수립

□ 내 집 주차장갯기 확대 시행

- 추진목표 : 120가구 132백만원 (시비 60백만원, 구비 72백만원)
- 추진실적 : 8가구 12,000천원 (추진율 9.09%)
  - 시비 : 4,000천원      - 구비 : 8,000천원
  - 가구당 : 최고 1,500천원 ~ 2,000 천원 보조

□ 공영주차장 운영 활성화

- 공영주차장 시설물정비 : 81개소(민간위탁 26, 거주자 55)
  - 정비기간 : 2000. 3. 1. ~ 3. 31.
  - 정비실적 : 안내표지판외 7건
    - 도색 233건, 주차구획선재정비 226건
- 주차장 임대수입 목표 : 1,975백만원(징수율 32.6%)
  - 민간위탁 : 1,569백만원      - 거주자우선 : 406백만원
- 2000년 상반기 징수실적

(단위 : 천원)

| 구 분       | 총 계       | 민 간 위 탁   | 거주자우선주차 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| '99년도     | 2,096,053 | 1,821,564 | 274,489 |
| 2000. 5월말 | 885,994   | 644,138   | 241,856 |

□ 버스전용차로 위반단속, 과태료 부과징수 실적

- 추진목표
  - 위반차 단속 및 부과 : 55,000건 1,790백만원
  - 과태료 징수 : 1,143백만원 (현년도 930백만원, 과년도 213백만원)
- 추진개요
  - 추진기간 : 2000. 1. 1 ~ 5. 31.
  - 주요추진사항
    - 위반차량의 신속 정확한 단속으로 운행질서 확립
    - 의견진술의 친절한 안내, 설명으로 자진납부 유도
    - 과태료 체납자에 대한 조기 채권 확보로 징수율 제고

○ 추진실적

- 위반차 단속 : 31,831건 (57.8%)
- 과태료 부과·징수
  - 현년도부과 : 1,603,540천원 · 징수:783,873천원(48.9%)
  - 과년도체납징수 : 163,360천원 (목표대비 76.7%)
- 체납압류 등록 : 20,865건

□ 주차위반 과태료 부과·징수율 제고

○ 추진목표

- 과태료부과 : 5,665백만원
- 과태료징수 : 3,573백만원(현년도 1,813백만원, 과년도 1,760백만원)

○ 추진실적

- 주차위반과태료 징수실적

(단위:백만원)

| 구 분 | 2000년도 (1~5월) |       |       |          |          |
|-----|---------------|-------|-------|----------|----------|
|     | 세입목표(A)       | 부과(B) | 징수(C) | 징수율(C/B) | 진도율(C/A) |
| 계   | 3,573         | 2,079 | 1,137 | 27.9     | 31.8     |
| 현년도 | 1,813         | 2,079 | 581   | 27.9     | 32.0     |
| 과년도 | 1,760         | -     | 556   | -        | 31.2     |

※ 전년도 동기 진도율: 31.6%

- 주차위반과태료 독촉고지서 재발급 일괄 송달
  - 대 상 : '98년도 주차위반과태료 체납 108,000건
- 은행 온라인 계좌 개설 자진납부 유도
  - 실적 : 7,677건 572,908천원. 과태료징수 총액대비 50%
- 주차위반과태료 고액 상습 체납자에게 공한문 발송
  - 대 상 : 500만원 이상 고액체납자
- 압류등록 실적 : 19,505건

# 2000년도 주요업무추진계획

## □ 불법주·정차 단속의 효율적 운영

○ 추진목표 : 142,000건

### ○ 추진계획

- 단속인원 : 23개조 54명

· 구분청 : 43명 (기능직 19명, 고용직 24명)

· 동사무소 : 11명 (기능직 0명, 고용직 11명)

· 단속차량 : 3대 (승합차 2대, 승용차 1대)

- 주차단속원 단계별 배치계획

· 2000년 9월 : 동 기능전환과 동시 단속원 전원 구분청 재배치

- 주차단속 중점추진

· 노선별 책임순찰제 지정운영 : 단속실명제


※ 차량 3대 운영(주차단속 예고방송실시)

· 신규단속지역 : 7일간 사전 홍보후 단속실시

- 주차단속 완화지역 운영 철저 17개소 : 단속의 일률성

## □ 주·정차 단속 전산화사업 추진

### ○ 업무흐름도

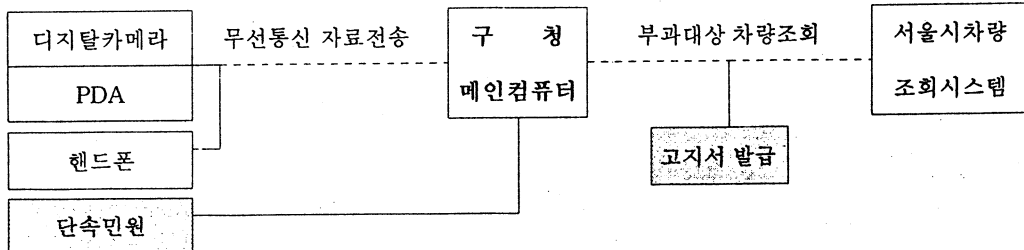

### ○ 향후 추진일정

- 2000. 6 : 주차관리 전산화사업 추진계획 시행 및 물품구입

- 2000. 7 : 전산시스템 및 장비 운영 시행



○ 홍보계획

- 월별(분기별) : 지역신문과 종로사랑지 게재, 동별 안내판 제작 수시게첨
- '99년도 7월 조사시 설치희망 대상 63가구에 대한 적극적인 홍보
- 전 동사무소에 대한 재조사를 실시하여 홍보 부족으로 누락가구가 발생하지 않도록 철저한 홍보 추진

□ 버스전용차로 운행질서 확립

○ 추진목표

- 위반차단속 및 부과 : 55,000건 1,790백만원
- 과태료 징수 : 1,143백만원 (현년도 930백만원, 과년도 213백만원)

○ 추진계획

- 운영노선의 불합리한 실·점선구간 조정으로 민원해소
  - 2000. 4 : 1차 조사자료 서울시에 제출
  - 2000. 6~ : 서울시, 경찰청 협의 노선도색
- 인력배치 효율화 및 탄력적 지도단속
  - 단속인력의 근무지 순환배치
  - 출,퇴근 시간대, 상급위반지역 이동단속 강화
- 위반차 과태료 자진납부 유도으로 징수율 제고
  - 이의신청(의견진술)시 친절한 안내, 설명으로 자진납부 유도
- 과태료 체납자에 대한 신속한 채권확보
  - 체납발생시 신속한 압류시행으로 채권조기 확보

□ 주차위반 과태료 부과, 징수율 제고

- 과태료부과 : 5,665백만원
- 과태료징수 : 3,573백만원(현년도 1,813백만원, 과년도 1,760백만원)
- 추진개요
  - 주차위반과태료 부과 및 징수에 따른 통합 전산시스템 구축
  - 주차위반과태료 납부의식 제고방안 강구
  - 과태료체납자에 대한 조기채권 확보로 징수율 제고

㉸ 추진계획

- 주차위반과태료 부과. 징수 및 체납관리 통합 전산시스템 구축
- 통합 프로그램 개발중이며 2000. 7. 1부터 운용(예정)
- 주차위반 과태료 납부의식 제고방안 강구
  - 과태료 부과기간 단축(2개월 → 1개월) 및 정확한 송달
  - 과년도 체납분에 대한 재발급 고지서 일괄 송달: 분기별 1회
- 과태료 체납자에 대한 조기 채권 확보 및 납부 독려
  - 압류등록 사유발생시 즉시 조치
  - 10회이상 과태료 체납자 집중독려(독려반 편성, 직원별 배시)
